



Ministerstvo financií
Slovenskej republiky



Vyhodnotenie Prioritnej osi 1 OPIS

Ivan Mikloš
Minister financií SR





Význam OPIS – Prioritná os 1

- Je to najvýznamnejší investičný nástroj pre zásadnú zmenu fungovania verejnej správy.
- Umožní významne zjednodušiť život všetkým občanom aj podnikateľom pri každodennej komunikácii s verejnou správou.





Uskutočnené kroky

- Pozastavenie všetkých rizikových projektov
- Aplikácia štandardných kontrolných mechanizmov v zmysle Nariadenia Rady (ES) č.1083/2006
- Rozsah vykonanej analýza:
 - 33 projektov
 - 25 000 strán
 - 2 mesiace práce
- Význam:
 - Identifikácia neoprávnených výdavkov pred reálnym zúčtovaním platieb
 - Včasná identifikácia všetkých rizík a zabránenie krokom, ktoré by spôsobili nezvratné škody





Kam by to viedlo?

- Nahradenie papierovej byrokracie elektronickou
- Zvyšovanie deficitu verejnej správy = trvalé dotovanie namiesto návratnosti
- Premrhanie jedinečnej príležitosti:
 - Jednorazový investičný balík
 - Možnosť zásadnej zmeny princípov fungovania VS






5 hlavných zistení:

1. Predraženia
2. Prevádzková neudržateľnosť
3. Nízka pridaná hodnota
4. Chýbajúce nástroje pre riadenie IT projektov
5. Riziko nefunkčnosti služieb



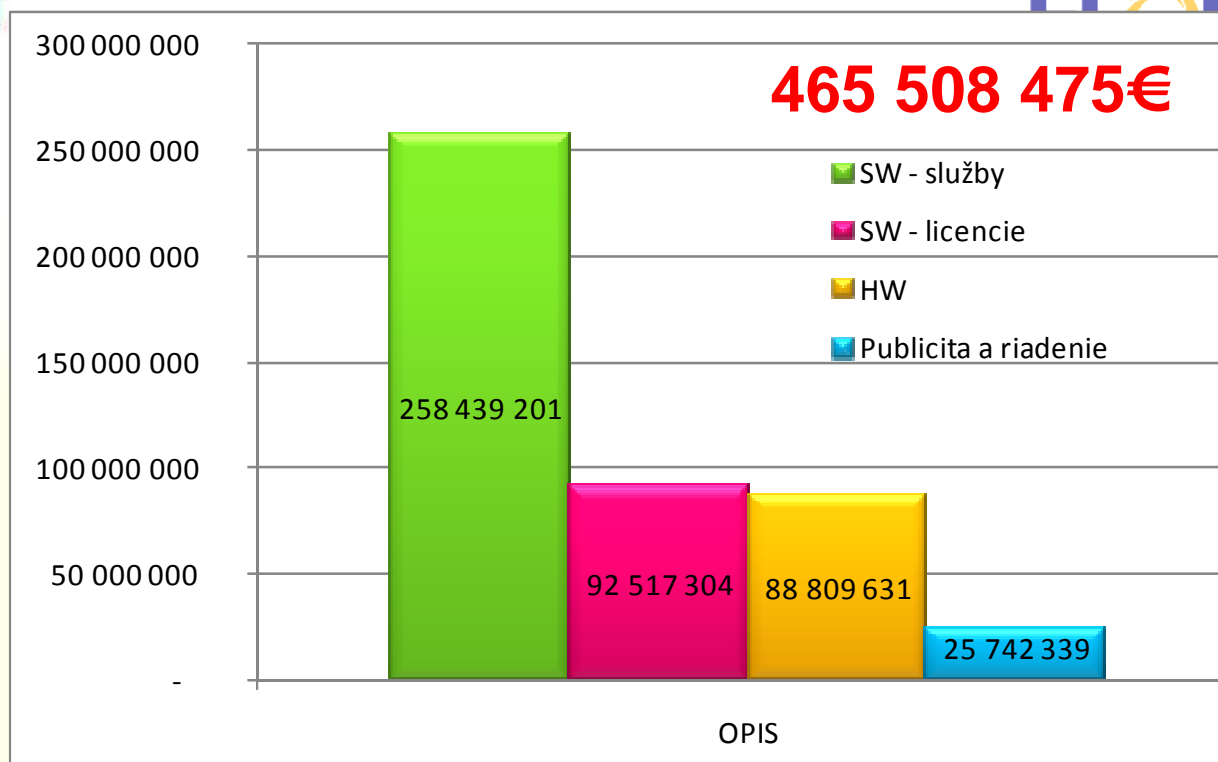

Strategické, rozpočtové, právne a organizačné problémy


VÝSLEDKY ANALÝZY -VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

33 projektov
25 000 strán podkladov
2 mesiace práce
Priemerne 8 ľudí





Celkový potenciál úspor

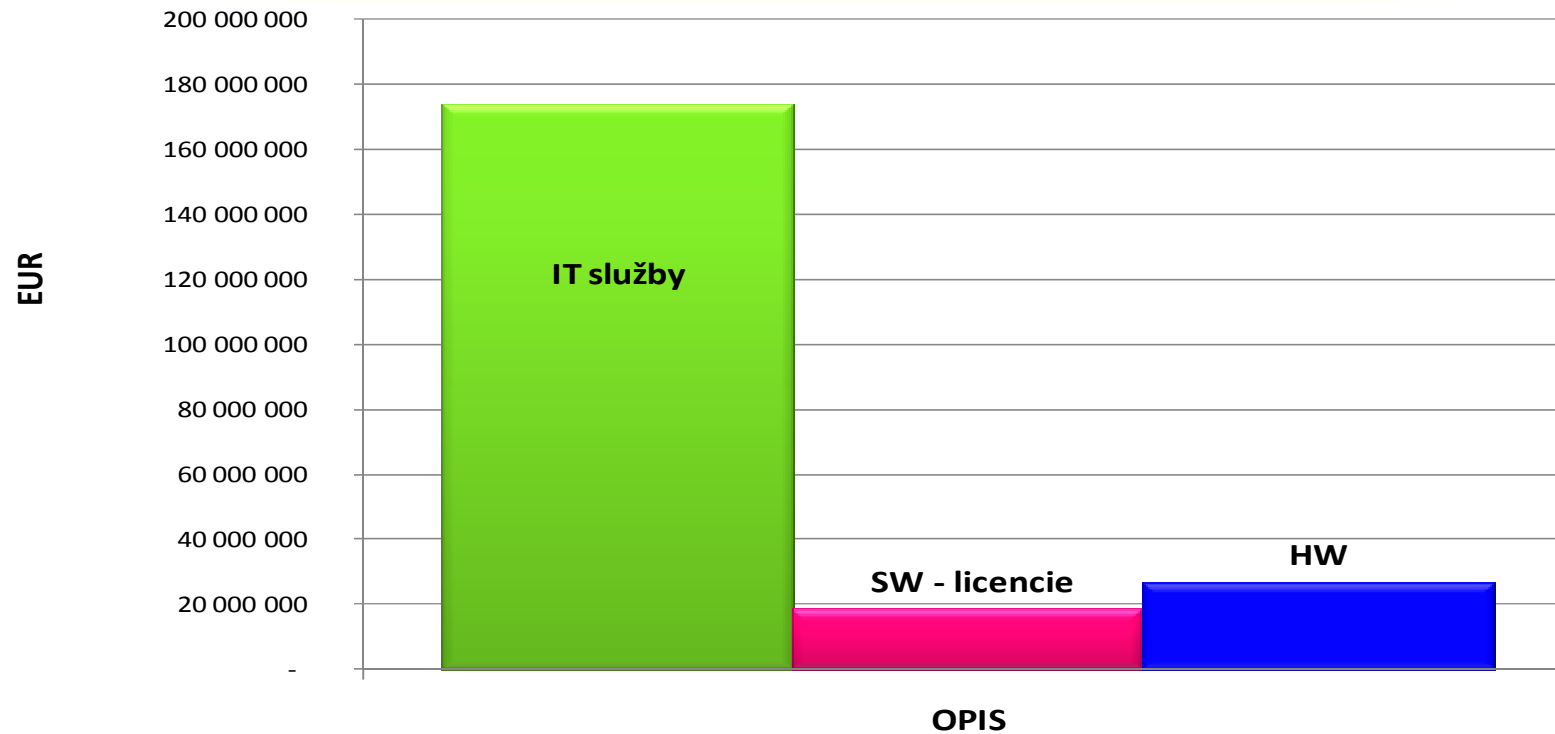




Analógia k stavbe

Budovanie stavby	Budovanie informačného systému verejnej správy
✓ Územný plán	Strategické dokumenty sú schválené a nie je potrebná ich zmena
✓ Architektonický plán	Žiadosť o NFP + opis projektu
✗ Vykonávací projekt a výkaz výmer	Detailný plán projektu, časový harmonogram a detailná funkčná špecifikácia nie je dnes vypracovaná vo väčšine schválených projektov
✓ Stavebné povolenie	MF SR uzavrelo zmluvy o poskytnutí NFP s 10 prijímateľmi
✓ Obstaranie dodávateľov	Prijímatelia zrealizovali väčšinu obstarávaní. V mnohých prípadoch sa nakupovalo draho a neúčelne.
✓ Realizácia stavby	Prevažná väčšina projektov sa nachádza v počiatočnej fáze analýzy.
✗ Stavebný dozor	Je zabezpečená finančná kontrola a monitorovanie v zmysle systému riadenia a systému finančného riadenia ŠF a KF. Procesy riadenia štandardne požadované pre IT projekty chýbajú.
✗ Kolaudácia	K dnešnému dňu nebol vytvorený ani jeden základný komponent a sprístupnená ani jedna e-služba verejnej správy. Chýbajú mechanizmy pre jednotný spôsob testovania a akceptácie služieb pred ich nasadením.





Interoperabilita a nefunkčnost projektov

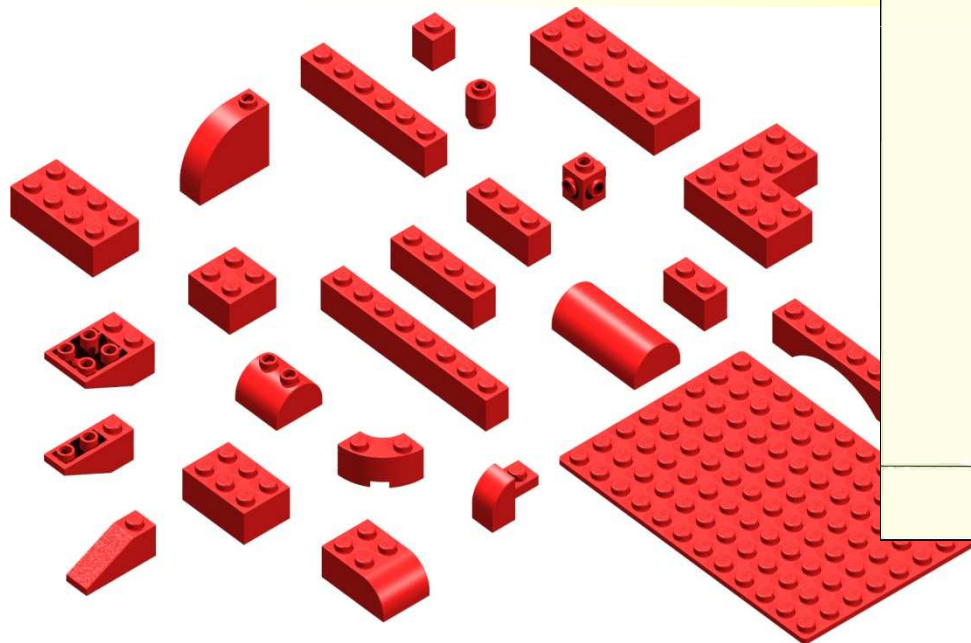



Operačný program Informatizácia spoločnosti

Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností, kód ITMS: 21110120003

V zmysle zmluvy o dielo č. objednávateľa 33/2009/OI, číslo zhotoviteľa SK_SC090099 zo dňa 16.9.2009 a jej prílohy č.1 Vám fakturujeme:

Názov tovaru / služby (ev. číselný kód*)	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena bez DPH v EUR	DPH 19%	Cena s DPH v EUR
položka 5.3.3 Nákup systémového SW 3	PRJ	1	413.775,00	413.775,00	78.617,25	492.392,25
položka 5.7. Nákup zariadení UPS (vrátane poistenia)	PRJ	1	62.848,00	62.848,00	11.941,12	74.789,12

PREBERACI PROTOKOL Č.39

Príloha č. 1 k preberaciemu protokolu č. 39 – špecifikácia predmetu

Číslo položky: 5.3.3, názov položky: „Nákup systémového SW 3“ na projekt v členení:

Produkty	Počet	SN
IBM Tivoli Storage Manager – TSM EE, TSM SAN, TSM DB	1	licencie bez SN
Microsoft Office 2007 standard	3	licencie bez SN
Microsoft Windows 2008 Datacenter Edition Licensing per CPU	28	licencie bez SN





Spoločný menovateľ
= **MÍŇANIE** peňazí, **NIE**
INVESTÍCIA!





Zásadné systémové opatrenia a zmeny pre dobrú investíciu – akčný plán

- Pravidlá obstarávania IT projektov a dohľad nad ich dodržiavaním
- Vybudovanie projektovej kancelárie
- Odstránenie problémov v schválených projektoch
- Prijímateľ pomoci musí preukázateľne zabezpečiť návratnosť investície
- Dohľad nad potrebnou zmenou legislatívy

